KICKOFF MEETING

Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver



PROJETO
90811, 91979, 92118, 89267, 92094, 92095, 92101, 92102, 70838, 70978, 89249 e 89307

GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha

UNIDADE
Energisa Tocantins

DATA DA REUNIÃO
04/11/2026

Dados Básicos

PROJETO

90811, 91979, 92118, 89267, 92094, 92095, 92101, 92102, 70838, 70978, 89249 e 89307

Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver

GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha Dias Junior

DEPARTAMENTO
DCMD

OBJETIVO E DESTINAÇÃO
Qualidade do Produto e Qualidade do Serviço

ESCOPO DETALHADO

Instalação de 12 religadores (RL) e 9 reguladores de tensão (RT) em 34,5 kV e 13,8 kV, além de 3 TripSaver e 1 remanejamento de RL

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2027 (CURVA OUT/26)

R$ 5,23 mi

Mensalização CAPEX de 08/10/2026. Base de ago/26: R$ 6,02 mi (antes da capitalização).

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

12 RL · 9 RT

Tensão: RT elevam o perfil para 0,945–0,97 pu. Continuidade: RL reduzem DEC/FEC nos conjuntos atendidos, conforme fichas do PN.

Escopo e orçamento por SIGCO

SIGCO	Projeto (Cadastro CAPEX)	Regional	Escopo físico (fichas 2027)	Energ.	Orçamento 08.10 (R$)	Benefício
92118	Estudo de QS - 4 de Araguaína IV	Norte	1 religador automático 13,8 kV (ID# E.O 551144)	**mai/27**	110.736	DEC -0,0775 h | FEC -0,0300 (base conjunto)
89267	Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP	Norte	2 reguladores de tensão 34,5 kV (ID# E.O 298105 e 38281041)	**mai/27**	802.322	Tensão 0,929 → 0,945 pu
89249	Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP	Norte	1 regulador de tensão 34,5 kV (ID# E.O 535352)	**ago/27**	399.614	Tensão 0,921 → 0,953 pu
90811	Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP	Centro	4 religadores 34,5 kV; 0,25 km RD MT 3#1/0 AWG; 1 poste; 2 chaves faca (NA/NF); 3 reguladores de tensão 34,5 kV (ID# E.O 33356216, 498478 e CH 8810033256)	**abr/27**	1.801.605	Tensão 0,91 → 0,95 pu
92095	Estudo de QS - LD Palmas - Lajeado	Centro	1 religador automático 34,5 kV (ID# E.O 425776)	**jun/27**	130.250	DEC -0,3251 h | FEC -0,0694 (base conjunto)
92101	Estudo de QS - 8 de Palmas IV	Centro	1 religador automático 13,8 kV N.A (CH 8861680122)	**jun/27**	110.736	DEC -0,1405 h | FEC -0,0756 (base conjunto)
70838	Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão	Centro	1 regulador de tensão 34,5 kV (ID# E.O 740431)	**jun/27**	399.614	Tensão 0,91 → 0,96 pu
92102	Estudo de QS - 6 de Palmas IV	Centro	1 religador automático 13,8 kV N.F (CH 8803933122)	**jun/27**	110.736	DEC -0,0430 h | FEC -0,0174 (base conjunto)
70978	Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP	Centro	1 regulador de tensão 34,5 kV; troca de fase (A→C) em 3 ramais	**jun/27**	399.914	Tensão 0,91 → 0,97 pu
92094	Estudo de QS - LD Palmas - Aparecida do Rio Negro	Centro	3 religadores automáticos 34,5 kV (CH 8800756083, 8841714092 e ID# E.O 49973587)	**jun/27**	390.750	DEC -0,4015 h | FEC -0,2040 (base conjunto)
91979	Estudo de QS - LD Gurupi - Dueré	Sul	1 religador rural 34,5 kV (CH 3300246076); 3 TripSavers	**mai/27**	239.582	DEC -0,5568 h | FEC -0,1037 (base conjunto)
89307	Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP	Sul	1 regulador de tensão 13,8 kV (EO 241355); remanejamento do RL 7924620047; manobras	**ago/27**	330.989	Tensão 0,92 → 0,96 pu
Total	**12 SIGCOs · 13 blocos**		**12 RL · 9 RT · 3 TripSaver · 1 remanejamento de RL**		**5.226.849**	

KICKOFF MEETING

PN 2027 – Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver

Gerente do projeto: Sandro Padilha Dias Junior · DCMD · KOM 29/10/2026 · Orçamento 2027: R$ 5.226.849 (base 08/10)

Stakeholders

INTERNOS

1. DPRE
2. DTEC
3. DIEO
4. GGPP
5. DECS
6. COPO
7. DEOP
8. DCMD
9. SESMT
10. DCSU
11. ASPO
12. ASGP
13. CGC
14. DMSL
15. DECF
16. GGA

EXTERNOS

1. Construtoras / Empreiteiras
2. Fornecedores
3. Delos / Valor Real
4. ANEEL
5. Prefeituras

Premissas

1. O projeto será executado conforme orçamento aprovado (base CAPEX 08/10/2026); desvios de rateio/impostos (até 10%) absorvidos pelo departamento.
2. EPS com capacidade executiva (90 dias) mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
3. Execução de cada bloco em 30 dias (45 dias para o bloco com 4 RL).
4. Equipamentos recebidos até 21/01, 19/03 e 28/05/2027 (lotes 1, 2 e 3).
5. Aprovação das LSS e análise de documentos de terceiros (10 dias corridos) pelo SESMT ETO no prazo.
6. Manutenção do escopo das fichas 2027, sem serviços não previstos.
7. Ausência de acidentes com paralisação; EPS atende aos procedimentos de segurança e ITs.
8. PMA emitido após a aprovação do PN, com almoxarifado de destino conferido e kit completo de periféricos.
9. Local, autorização de passagem, aterramento e sinal GPRS validados antes da execução.
10. Equipamentos homologados e laudos validados; DEOP, DMSL e GAT disponíveis para proteção e comissionamento.
11. Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO e de desligamentos programados aprovados.

Restrições

1. Iniciar a obra somente após assinatura do contrato com a empreiteira executora.
2. Energização dentro do mês definido pela ASPO (abr, mai, jun e ago/2027).
3. Instalar somente com local e desligamento validados.
4. Encerramento técnico antes do inventário; contábil após fiscalização da Gestão de Ativos, até 17/11/2027.

Penalidades

1. Multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
2. Substituição da empreiteira e remanejamento de equipes por baixa capacidade ou atraso.
3. Medição pelas O.S. se a empreiteira não enviar as medições no prazo.
4. Não atingimento do benefício esperado pela unidade.

Datas de Interface – AT e MT

Nível	Marco / atividade de interface	Data prevista	Responsável	Status
MT	Desligamento – 1º bloco (B4)	28/01/2027	COI / DCMD	A iniciar
MT	Ajuste de proteção – 1º bloco (B5)	01/04/2027	DEOP	A iniciar
MT	Comissionamento / GAT – 1º bloco	01/04/2027	DMSL / GAT	A iniciar
MT	Energização – último bloco (B3)	20/08/2027	DCMD	A iniciar

Curva Orçamentária (R$ mil)

Reg.	SIGCOs	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Norte	3 SIGCOs	-	-	433	480	-	182	218	-	-	-	-	-	**1.313**
Centro	7 SIGCOs	122	855	842	814	711	-	-	-	-	-	-	-	**3.344**
Sul	2 SIGCOs	-	-	147	93	-	203	128	-	-	-	-	-	**571**

Aquisições e Contratações

Item / serviço	Tipo	Data necessária	Status
Religadores (12) e TripSaver (3)	Equipamento	21/01/2027	PMA a emitir
Reguladores de tensão (9)	Equipamento	21/01/2027	PMA a emitir
Empreiteira executora (EPS) – O.S. lote 1	Contratação	27/01/2027	A emitir

Principais Riscos do Projeto

1. Atraso no fornecimento de RL/RT e IEDs (lead time de até 210 dias – SEL).
2. Prazo curto do 90811 (energização abr/27, execução a partir de 28/01/2027).
3. Concentração de comissionamentos em jun/27 (6 blocos na Regional Centro).
4. Indisponibilidade de Linha Viva / cancelamento de desligamentos programados.
5. Local sem validação prévia ou empreiteira sem capacidade executiva.
6. Acidente de trabalho com paralisação da obra.


Aquisições e Contratações

Material / serviço	Qtd	SIGCO	Necessário até	Status	Nº PMA / RFP
Religador (RL) 34,5 kV	9	91979, 92094, 92095, 90811	16/02/2027	A confirmar	–
Religador (RL) 13,8 kV	3	92118, 92101, 92102	16/03/2027	A confirmar	–
Regulador de tensão (RT) 34,5 kV	8	89267, 70838, 70978, 90811, 89249	16/02/2027	A confirmar	–
Regulador de tensão (RT) 13,8 kV	1	89307	22/06/2027	A confirmar	–
TripSaver	3	91979	16/03/2027	A confirmar	–
Remanejamento de religador (RL)	1	89307	22/06/2027	Sem aquisição	–
Empreiteira executora da obra (contrato vigente)	–	Todos	16/02/2027	Contrato vigente	–

"Necessário até" = início da execução do bloco mais cedo que usa o item (WBS). Status e nº de PMA/RFP a confirmar com Suprimentos – informações não constam nas planilhas recebidas.

Curva orçamentária 2027

SIGCO	Projeto	Reg.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
92118	Estudo de QS - 4 de Araguaína IV	Norte	-	-	67.952	42.784	-	-	-	-	-	-	-	-	**110.736**
89267	Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP	Norte	-	-	364.692	437.630	-	-	-	-	-	-	-	-	**802.322**
89249	Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP	Norte	-	-	-	-	-	181.643	217.971	-	-	-	-	-	**399.614**
90811	Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP	Centro	122.143	854.999	824.463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.801.605**
92095	Estudo de QS - LD Palmas - Lajeado	Centro	-	-	17.761	88.807	23.682	-	-	-	-	-	-	-	**130.250**
92101	Estudo de QS - 8 de Palmas IV	Centro	-	-	-	72.985	37.751	-	-	-	-	-	-	-	**110.736**
70838	Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão	Centro	-	-	-	263.382	136.232	-	-	-	-	-	-	-	**399.614**
92102	Estudo de QS - 6 de Palmas IV	Centro	-	-	-	55.368	55.368	-	-	-	-	-	-	-	**110.736**
70978	Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP	Centro	-	-	-	199.957	199.957	-	-	-	-	-	-	-	**399.914**
92094	Estudo de QS - LD Palmas - Aparecida do Rio Negro	Centro	-	-	-	133.210	257.540	-	-	-	-	-	-	-	**390.750**
91979	Estudo de QS - LD Gurupi - Dueré	Sul	-	-	147.016	92.566	-	-	-	-	-	-	-	-	**239.582**
89307	Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP	Sul	-	-	-	-	-	203.107	127.882	-	-	-	-	-	**330.989**
	Total (R$)		**122.143**	**854.999**	**1.421.884**	**1.386.690**	**710.530**	**384.750**	**345.854**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.226.849**

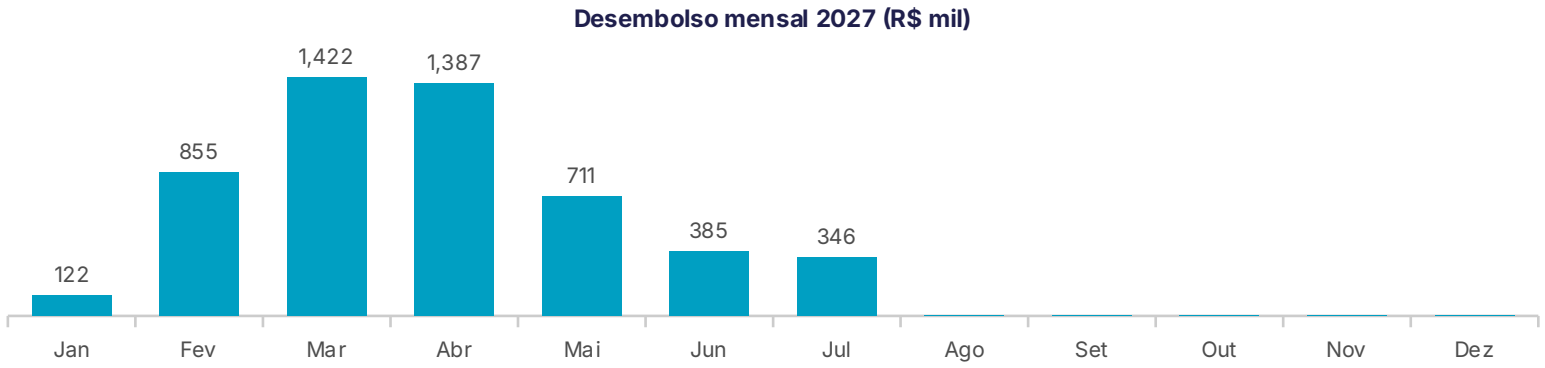

ORÇAMENTO 2027 · BASE 08/10

R$ 5,23 mi

72% do desembolso até abril/27 e 100% até julho/27. Distribuição em dias corridos entre o início da execução e o fim da fiscalização de cada bloco.

Premissas, Restrições e Penalidades

PREMISSAS

1. O projeto será executado conforme orçamento aprovado (base CAPEX 08/10/2026); desvios de rateio de materiais e impostos (referência: até 10%) são absorvidos no orçamento do departamento.
2. EPS com capacidade executiva comprovada para o horizonte de 90 dias; mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
3. Cumprimento dos prazos dos blocos de instalação de equipamentos especiais (RL/RT) definidos na WBS.
4. Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira, considerando as obras reguladas concorrentes na mesma empreiteira.
5. Aprovação das LSS e análise da documentação de terceiros pelo SESMT ETO (10 dias corridos) dentro do prazo solicitado.
6. Manutenção do escopo do projeto, sem inclusão de serviços não previstos inicialmente.
7. Ausência de acidentes de trabalho que ocasionem paralisação; EPS atende a todos os procedimentos de segurança e às ITs.
8. PMA dos equipamentos emitido logo após a aprovação do PN, com almoxarifado de destino conferido e kit completo de materiais periféricos.
9. Local de instalação, autorização de passagem, medição de aterramento e sinal GPRS validados (ASPO, COPC e Operação) antes da execução.
10. Equipamentos homologados na base de ativos e laudos validados antes do cadastro; DEOP, DMSL e GAT disponíveis para proteção e comissionamento.
11. Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO e de desligamentos programados aprovados, garantindo continuidade nas áreas energizadas.

RESTRIÇÕES

1. Iniciar a obra somente após assinatura do contrato de prestação de serviços com a empreiteira executora.
2. Energização dentro do mês definido pela ASPO (abr, mai, jun e ago/2027).
3. Instalar equipamentos somente com o local e o desligamento programado validados.
4. Encerramento técnico antes do inventário anual do almoxarifado; contábil após fiscalização da Gestão de Ativos e até 17/11/2027.


PENALIDADES

1. Aplicação de multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
2. Substituição da empreiteira e remanejamento de equipes por baixa capacidade ou atraso; medição pelas O.S. se faltar medição no prazo.
3. Não atingimento do benefício esperado pela unidade.

Principais Riscos do Projeto

	RISCO	PLANO ATENUANTE	PLANO DE CONTINGÊNCIA
1	**Acidente de trabalho** Acidente de trabalho durante a execução da obra	• Reunião de integração com a empreiteira • Inspeções periódicas e DDS • Paradas de segurança trimestrais	• Paralisar qualquer atividade executada de forma insegura • Acionar o SESMT • Investigar o ocorrido
2	**Atraso em projeto, LSS e documentos** Projeto executivo, local sem autorização ou aterramento inadequado e LSS/documentos do SESMT	• Validar o local com ASPO, COPC e Operação antes da execução • Mapear autorizações de passagem; medir o aterramento • Antecipar os documentos (SESMT: 10 dias)	• Remanejar o equipamento / definir novo ponto • Ampliar a malha de aterramento (poço/concreto) • Antecipar outras atividades da obra
3	**Atraso de materiais e equipamentos** RL/RT/TripSaver e kit de periféricos fora das datas da WBS (lead time de até 210 dias)	• PMA logo após o PN; conferir o almoxarifado de destino • Diligenciar fornecedores e compras; kit completo • Acompanhar o forecast (rateio e impostos)	• Adiantar estruturas enquanto o equipamento não chega • Priorizar frentes pela meta de energização • Avaliar fornecedor homologado alternativo
4	**Linha Viva e desligamentos** Falta de equipe de Linha Viva ETO e cancelamento de desligamentos programados	• Estudo prévio de viabilidade de desligamento e transferência de carga • Programar Linha Viva e COI com antecedência	• Intensificar o apoio de Linha Viva; reprogramar desligamentos • Ajustar a sequência das frentes
5	**Atraso no comissionamento** Laudos inconsistentes, equipamento não homologado, falha no EO/TS e comissionamentos concentrados em jun/27	• Fluxo completo antes da SS ao DMSL (aterramento, EO/SIGOT, proteção, SCADA) • Validar laudos e homologação; reunião semanal	• Comissionar em bancada / linha de produção • Chamado à TI/GTD para cadastro; reavaliar a programação
6	**Atraso na execução / abandono de contrato** Baixa capacidade, desmobilização ou fim de contrato da empreiteira, com obras reguladas concorrentes	• Acompanhar capacidade executiva (90 dias) e cronograma semanal • Evitar frentes em contratos próximos do fim; abertura de RFP	• Multa/advertência; remanejar equipes entre regionais • Aditivo de contratos vigentes ou substituição da empresa

Cronograma Macro

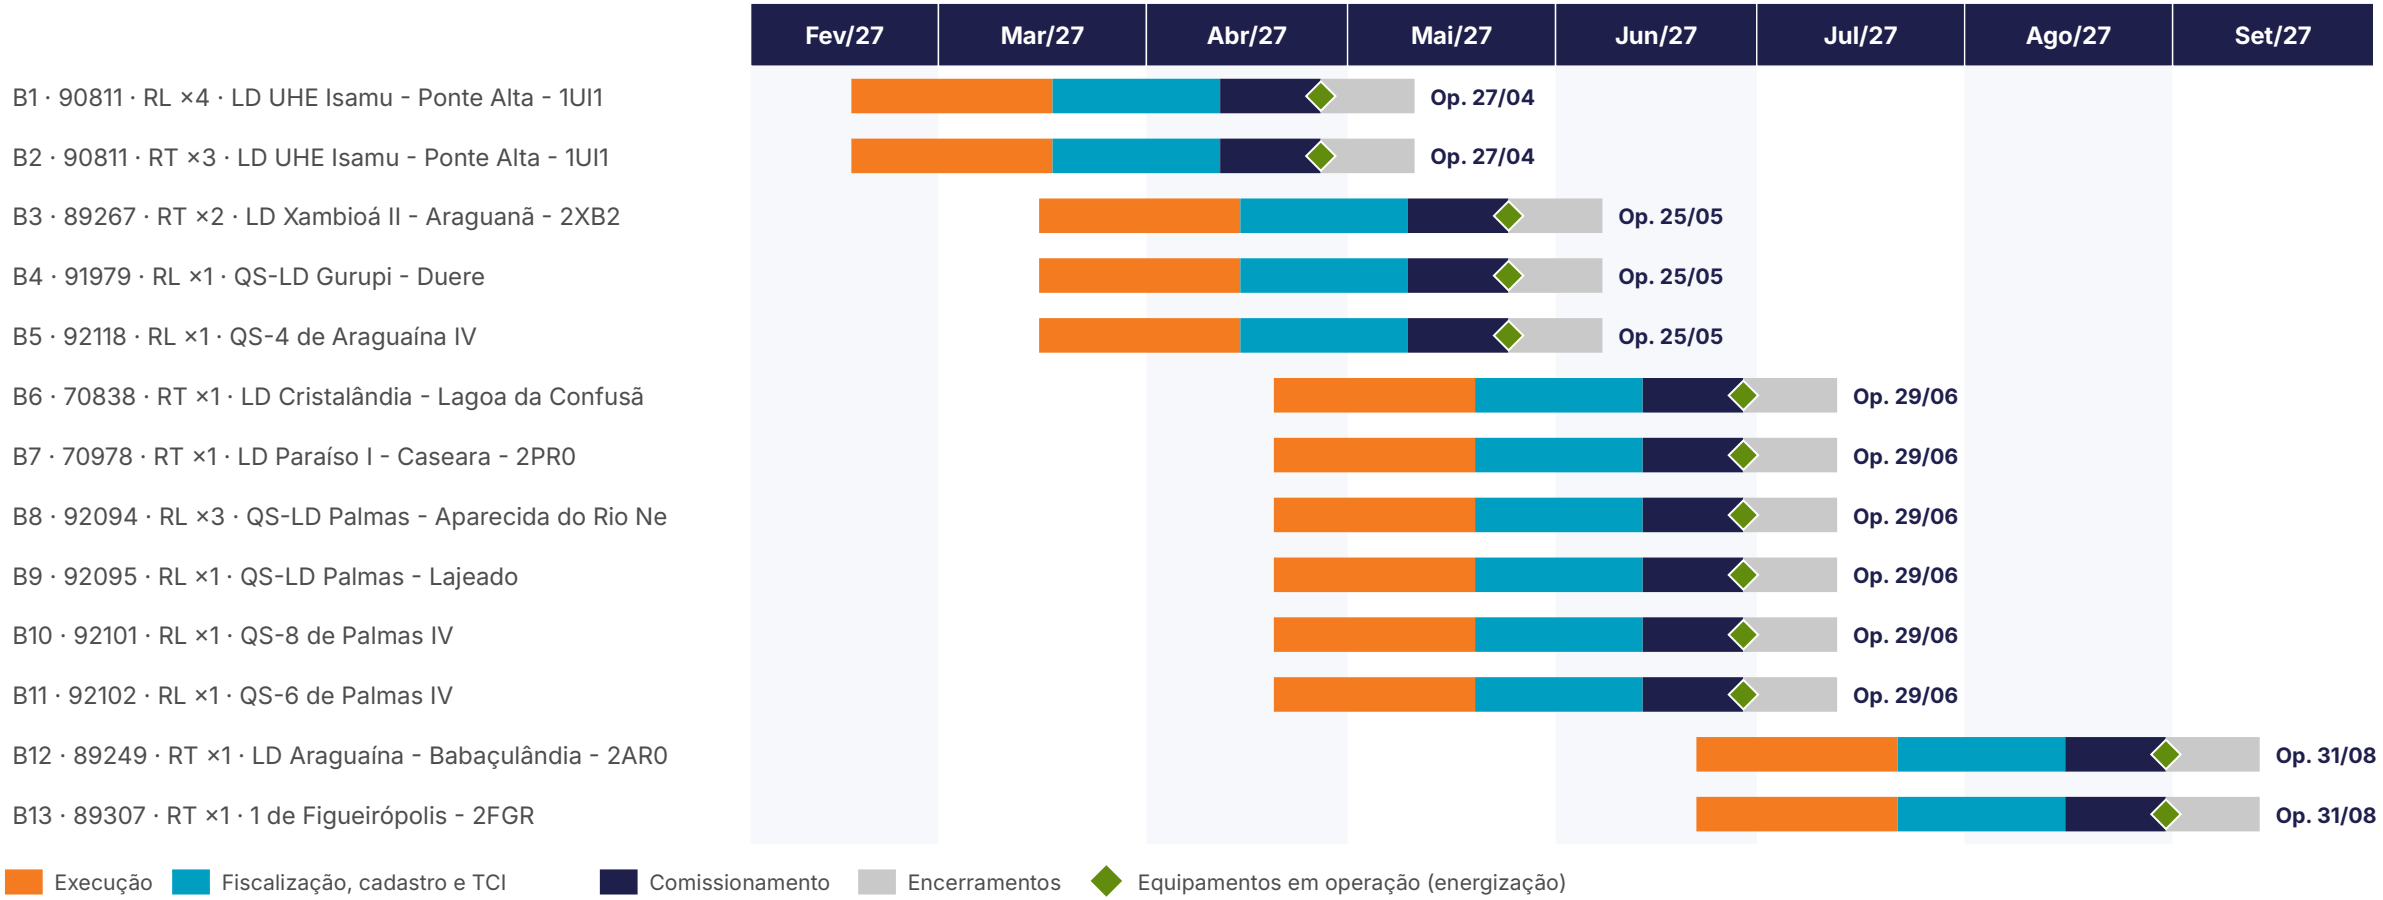

Marco "Equipamentos em Operação" no último dia útil do mês de energização previsto no PN. Prazos padrão dos blocos RL/RT da WBS 2026; cronograma calculado de trás para frente.

WBS – Estrutura Analítica do Projeto

1
PN 2027
Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver

Escopo do prazo: somente blocos de instalação de equipamentos especiais. Obras de rede (RD MT), projeto executivo e recebimento de material ficam fora desta WBS.

WBS	Bloco	SIGCO	Equipamento
1.1	BLOCO 1 – LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1	90811	4 RL 34,5 kV
1.2	BLOCO 2 – LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1	90811	3 RT 34,5 kV
1.3	BLOCO 3 – LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2	89267	2 RT 34,5 kV
1.4	BLOCO 4 – QS-LD Gurupi - Duere	91979	1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver
1.5	BLOCO 5 – QS-4 de Araguaína IV	92118	1 RL 13,8 kV
1.6	BLOCO 6 – LD Cristalândia - Lagoa da Confusão	70838	1 RT 34,5 kV
1.7	BLOCO 7 – LD Paraíso I - Caseara - 2PR0	70978	1 RT 34,5 kV
1.8	BLOCO 8 – QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro	92094	3 RL 34,5 kV
1.9	BLOCO 9 – QS-LD Palmas - Lajeado	92095	1 RL 34,5 kV
1.10	BLOCO 10 – QS-8 de Palmas IV	92101	1 RL 13,8 kV
1.11	BLOCO 11 – QS-6 de Palmas IV	92102	1 RL 13,8 kV
1.12	BLOCO 12 – LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0	89249	1 RT 34,5 kV
1.13	BLOCO 13 – 1 de Figueirópolis - 2FGR	89307	1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL

Pacotes de trabalho de cada bloco
1.n.1 Executar obras (30 / 45 d)
1.n.2 Obras concluídas ◆
1.n.3 Fiscalização (12 d)
1.n.4 Cadastro EO / Integração parcial (10 d)
1.n.5 Entrega do TCI / Integração final (15 d)
1.n.6 Chamado / Atend. GAT – só RL (8 d)
1.n.7 Comissionar equipamentos (15 d)
1.n.8 Equipamentos em operação ◆
1.n.9 Encerramento técnico (7 du)
1.n.10 Encerramento contábil (3 du)


WBS – Cronograma Detalhado (1/4)

Tarefa	Dur. · Início – Término	Fev/27	Mar/27	Abr/27	Mai/27
BLOCO 1 · SIGCO 90811 · RL — 4 RL 34,5 kV					
Executar Obras	30 d · 16/02 – 18/03				
Fiscalização	12 d · 19/03 – 31/03				
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 01/04 – 11/04				
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 12/04 – 27/04				
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 12/04 – 20/04				
Comissionar Equipamentos	15 d · 12/04 – 27/04				
Encerramento Técnico	7 du · 28/04 – 06/05				
Encerramento Contábil	3 du · 07/05 – 11/05				
BLOCO 2 · SIGCO 90811 · RT — 3 RT 34,5 kV					
Executar Obras	30 d · 16/02 – 18/03				
Fiscalização	12 d · 19/03 – 31/03				
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 01/04 – 11/04				
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 12/04 – 27/04				
Comissionar Equipamentos	15 d · 12/04 – 27/04				
Encerramento Técnico	7 du · 28/04 – 06/05				
Encerramento Contábil	3 du · 07/05 – 11/05				



WBS – Cronograma Detalhado (2/4)

Tarefa	Dur. · Início – Término
BLOCO 3 · SIGCO 89267 · RT — 2 RT 34,5 kV	
Executar Obras	30 d · 16/03 – 15/04
Fiscalização	12 d · 16/04 – 28/04
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 29/04 – 09/05
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 10/05 – 25/05
Comissionar Equipamentos	15 d · 10/05 – 25/05
Encerramento Técnico	7 du · 26/05 – 03/06
Encerramento Contábil	3 du · 04/06 – 08/06
BLOCOS 4, 5 · SIGCO 91979, 92118 · RL — 1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver; 1 RL 13,8 kV	
Executar Obras	30 d · 16/03 – 15/04
Fiscalização	12 d · 16/04 – 28/04
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 29/04 – 09/05
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 10/05 – 25/05
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 10/05 – 18/05
Comissionar Equipamentos	15 d · 10/05 – 25/05
Encerramento Técnico	7 du · 26/05 – 03/06
Encerramento Contábil	3 du · 04/06 – 08/06

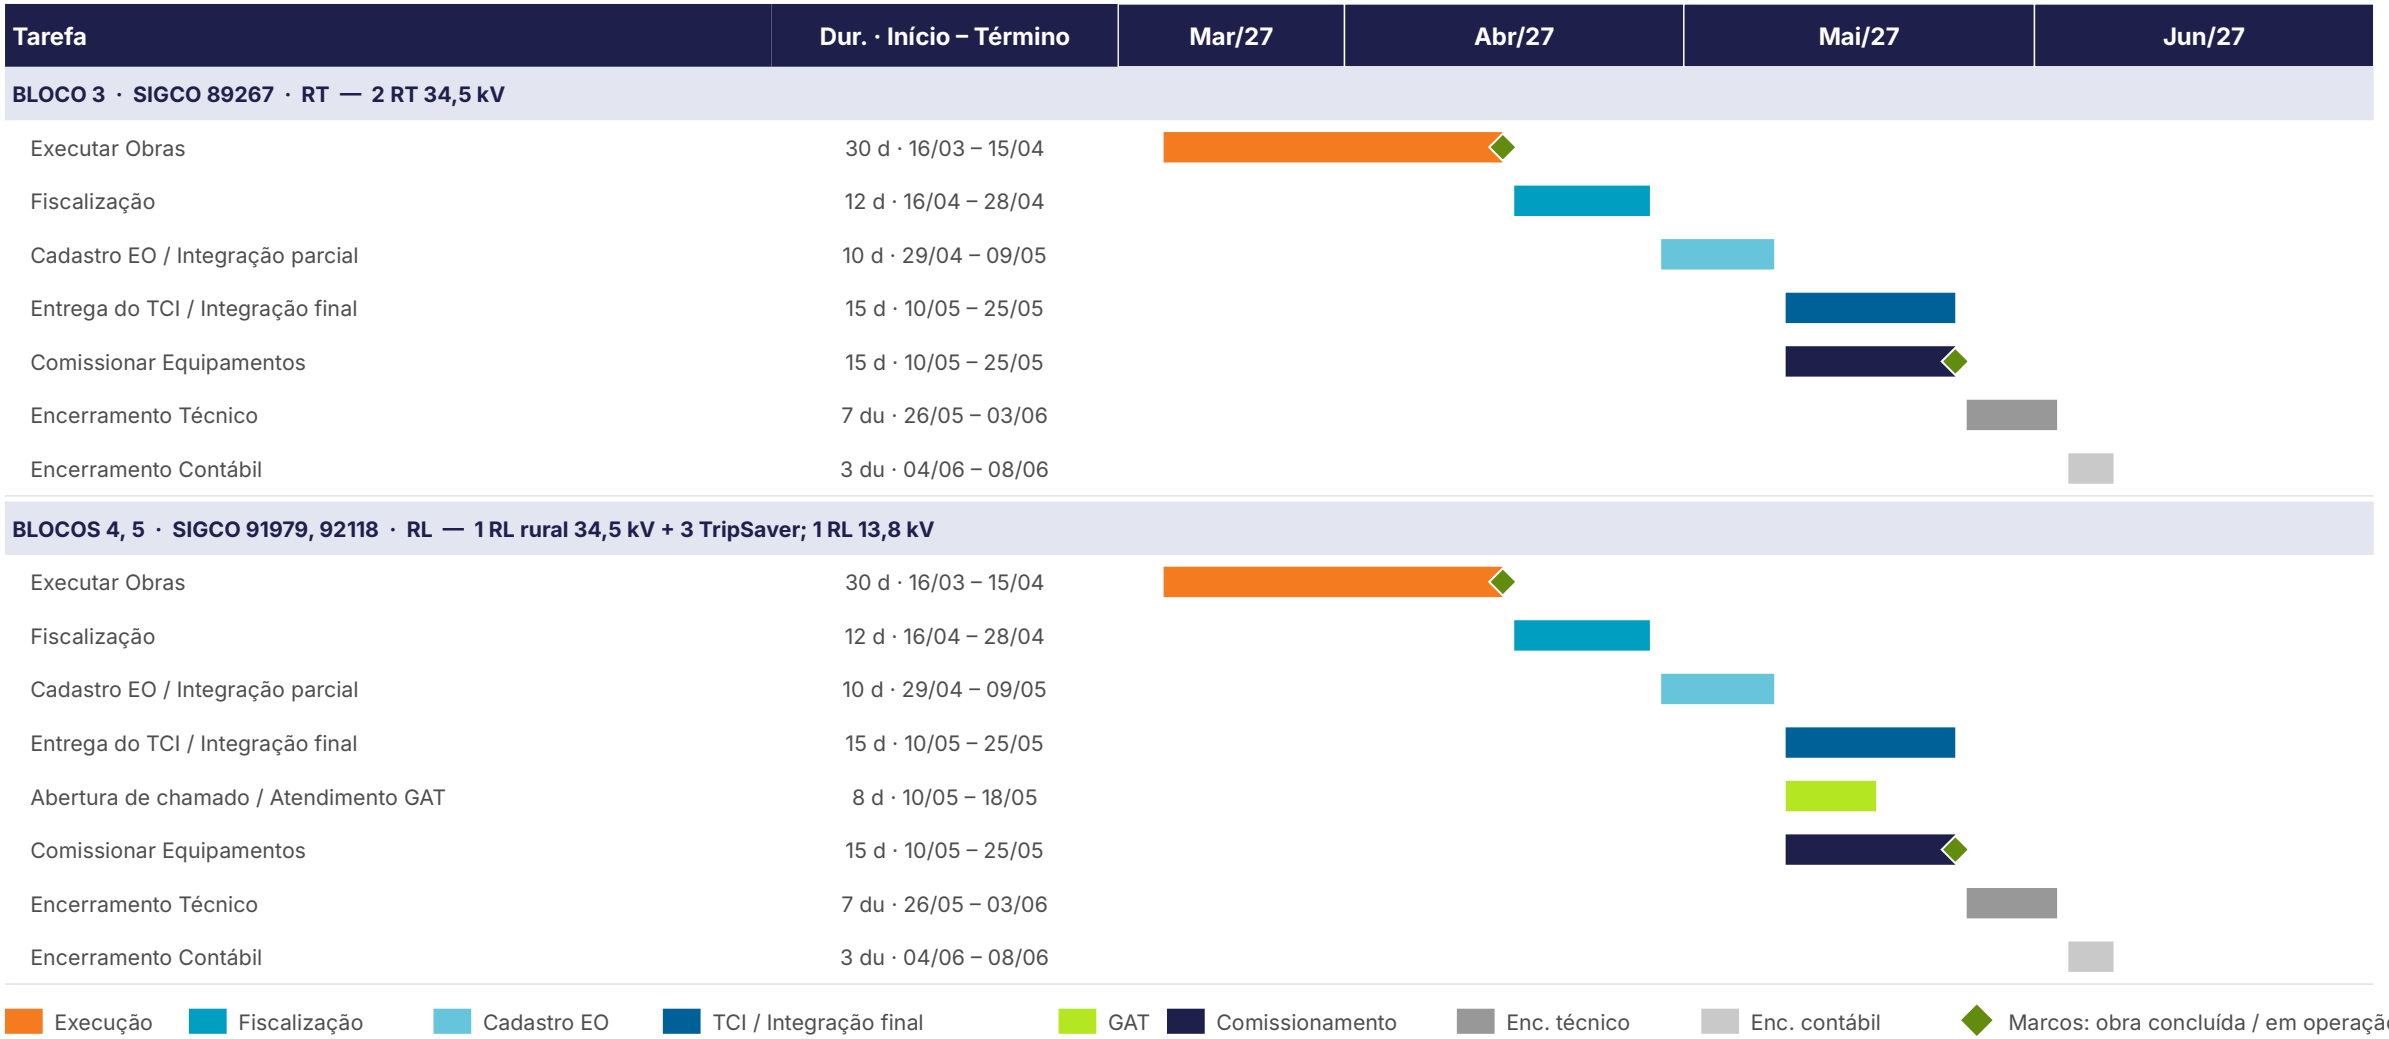


WBS – Cronograma Detalhado (3/4)

Tarefa	Dur. · Início – Término	Abr/27	Mai/27	Jun/27	Jul/27
BLOCOS 6, 7 · SIGCO 70838, 70978 · RT — 1 RT 34,5 kV; 1 RT 34,5 kV					
Executar Obras	30 d · 20/04 – 20/05				
Fiscalização	12 d · 21/05 – 02/06				
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 03/06 – 13/06				
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 14/06 – 29/06				
Comissionar Equipamentos	15 d · 14/06 – 29/06				
Encerramento Técnico	7 du · 30/06 – 08/07				
Encerramento Contábil	3 du · 09/07 – 13/07				
BLOCOS 8, 9, 10, 11 · SIGCO 92094, 92095, 92101, 92102 · RL — 3 RL 34,5 kV; 1 RL 34,5 kV; 1 RL 13,8 kV; 1 RL 13,8 kV					
Executar Obras	30 d · 20/04 – 20/05				
Fiscalização	12 d · 21/05 – 02/06				
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 03/06 – 13/06				
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 14/06 – 29/06				
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 14/06 – 22/06				
Comissionar Equipamentos	15 d · 14/06 – 29/06				
Encerramento Técnico	7 du · 30/06 – 08/07				
Encerramento Contábil	3 du · 09/07 – 13/07				



WBS – Cronograma Detalhado (4/4)

Tarefa	Dur. · Início – Término
BLOCO 12 · SIGCO 89249 · RT — 1 RT 34,5 kV	
Executar Obras	30 d · 22/06 – 22/07
Fiscalização	12 d · 23/07 – 04/08
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 05/08 – 15/08
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 16/08 – 31/08
Comissionar Equipamentos	15 d · 16/08 – 31/08
Encerramento Técnico	7 du · 01/09 – 09/09
Encerramento Contábil	3 du · 10/09 – 14/09
BLOCO 13 · SIGCO 89307 · RT — 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL	
Executar Obras	30 d · 22/06 – 22/07
Fiscalização	12 d · 23/07 – 04/08
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 05/08 – 15/08
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 16/08 – 31/08
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 16/08 – 24/08
Comissionar Equipamentos	15 d · 16/08 – 31/08
Encerramento Técnico	7 du · 01/09 – 09/09
Encerramento Contábil	3 du · 10/09 – 14/09

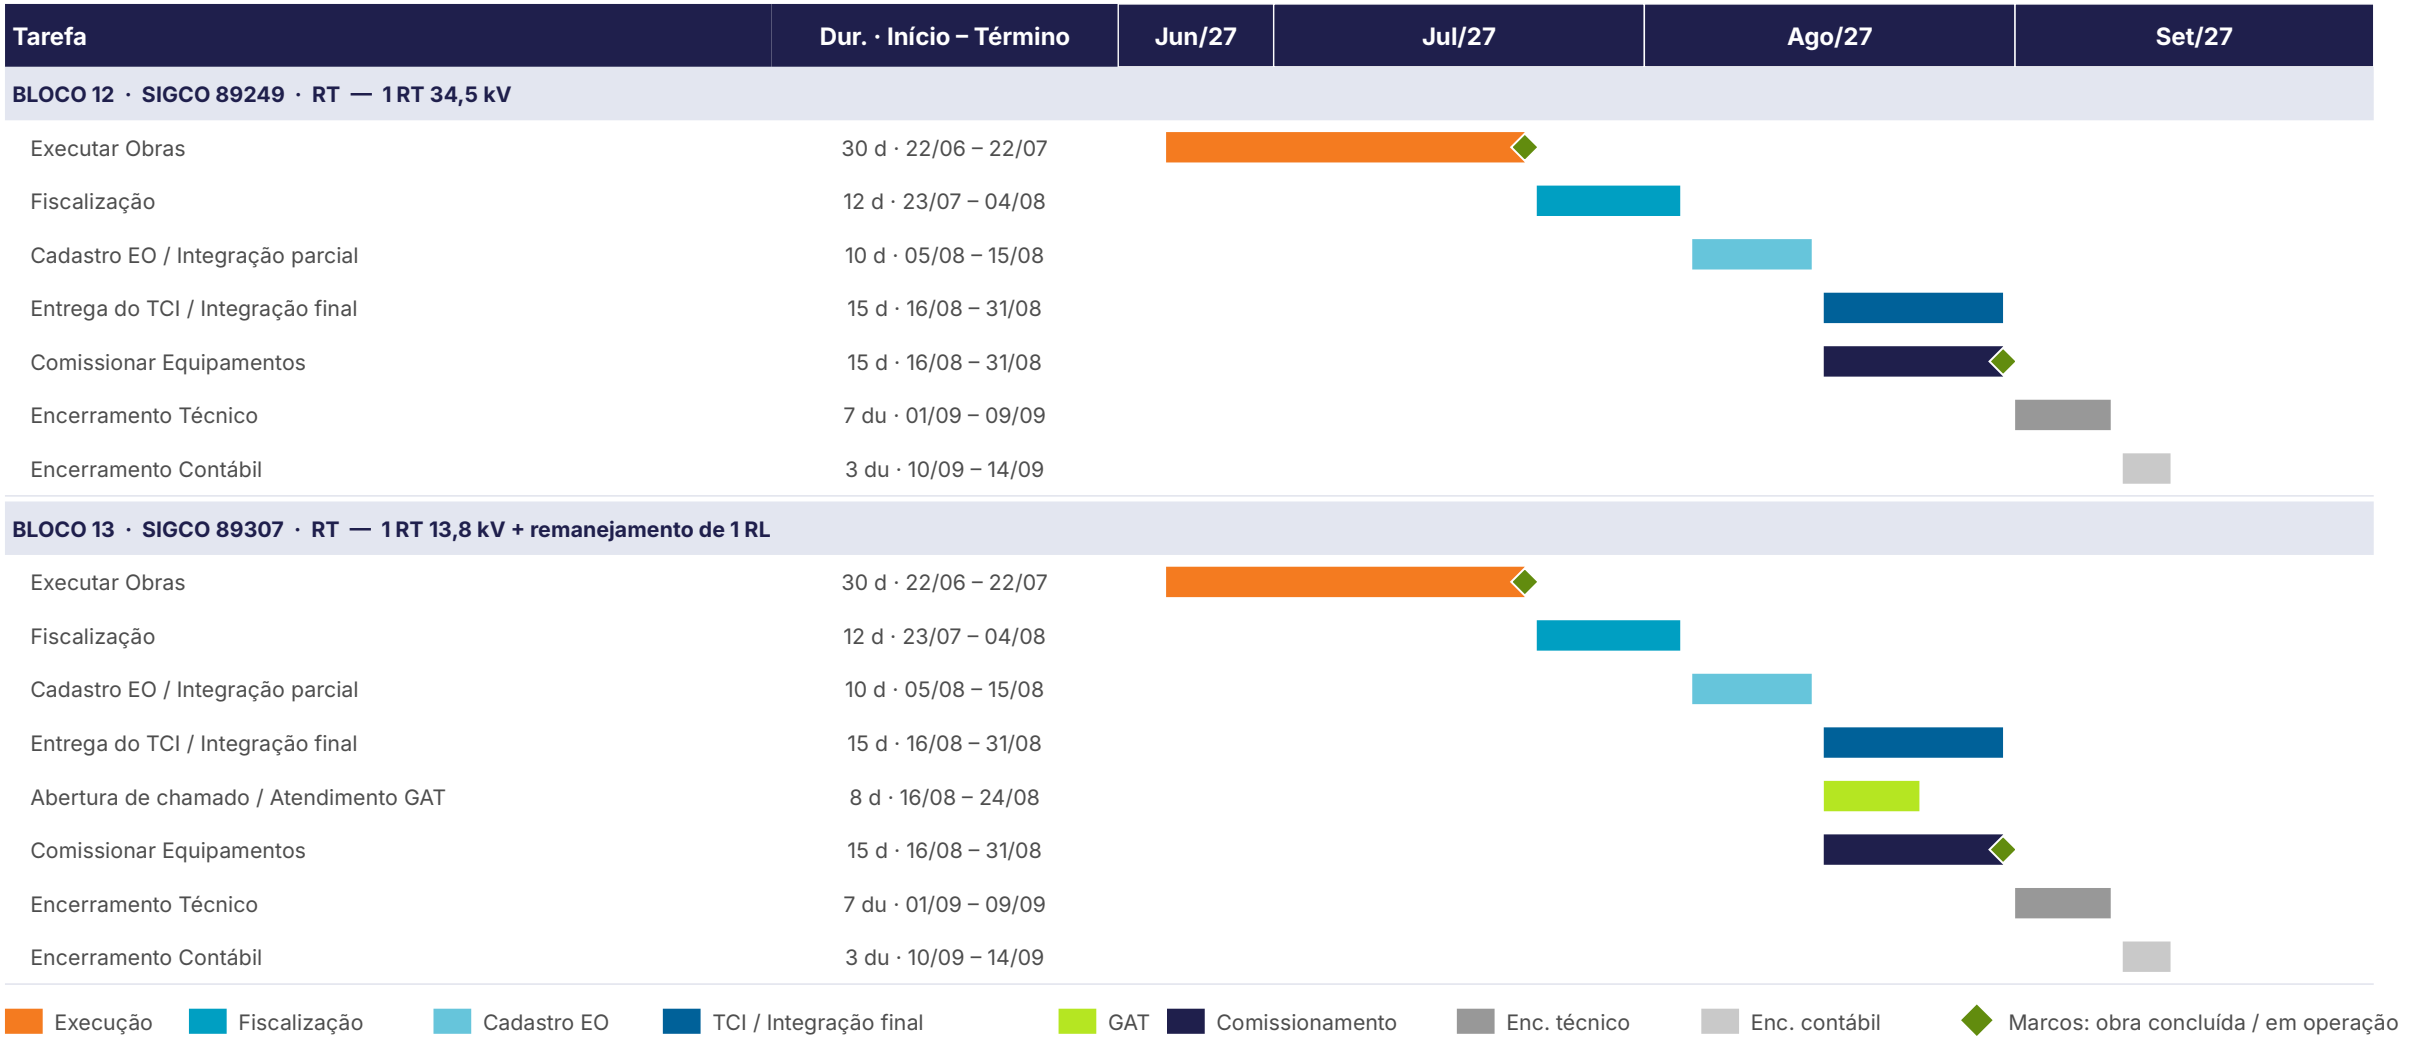

KICKOFF MEETING · PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER

Obrigado.

Escritório de Projetos PMO-ETO



GERENTE DO PROJETO
SANDRO PADILHA



UNIDADE
Energisa Tocantins
