KICKOFF MEETING

Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver



PROJETO
90811, 91979, 92118, 89267, 92094, 92095, 92101, 92102, 70838, 70978, 89249 e 89307

GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha

UNIDADE
Energisa Tocantins

DATA DA REUNIÃO
04/11/2026

Dados Básicos

PROJETO

90811, 91979, 92118, 89267, 92094, 92095, 92101, 92102, 70838, 70978, 89249 e 89307

Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver

GERENTE DO PROJETO
Sandro Padilha Dias Junior

DEPARTAMENTO
DCMD

OBJETIVO E DESTINAÇÃO
Qualidade do Produto e Qualidade do Serviço

ESCOPO DETALHADO

Instalação de 12 religadores (RL) e 9 reguladores de tensão (RT) em 34,5 kV e 13,8 kV, além de 3 TripSaver e 1 remanejamento de RL

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO 2027 (CURVA OUT/26)

R$ 5,23 mi

Mensalização CAPEX de 08/10/2026. Base de ago/26: R$ 6,02 mi (antes da capitalização).

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

12 RL · 9 RT

Tensão: RT elevam o perfil para 0,945–0,97 pu. Continuidade: RL reduzem DEC/FEC nos conjuntos atendidos, conforme fichas do PN.

KICKOFF MEETING

PN 2027 – Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver

Gerente do projeto: Sandro Padilha Dias Junior · DCMD · KOM 29/10/2026 · Orçamento 2027: R$ 5.226.849 (base 08/10)

Stakeholders

INTERNOS

1. DPRE
2. DTEC
3. DIEO
4. GGPP
5. DECS
6. COPO
7. DEOP
8. DCMD
9. SESMT
10. DCSU
11. ASPO
12. ASGP
13. CGC
14. DMSL
15. DECF
16. GGA

EXTERNOS

1. Construtoras / Empreiteiras
2. Fornecedores
3. Delos / Valor Real
4. ANEEL
5. Prefeituras

Premissas

1. O projeto será executado conforme orçamento aprovado (base CAPEX 08/10/2026); desvios de rateio/impostos (até 10%) absorvidos pelo departamento.
2. EPS com capacidade executiva (90 dias) mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
3. Execução de cada bloco em 30 dias (45 dias para o bloco com 4 RL).
4. Equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027; nenhuma execução inicia antes de 06/04/2027.
5. Aprovação das LSS e análise de documentos de terceiros (10 dias corridos) pelo SESMT ETO no prazo.
6. Manutenção do escopo das fichas 2027, sem serviços não previstos.
7. Ausência de acidentes com paralisação; EPS atende aos procedimentos de segurança e ITs.
8. PMA emitido após a aprovação do PN, com almoxarifado de destino conferido e kit completo de periféricos.
9. Local, autorização de passagem, aterramento e sinal GPRS validados antes da execução.
10. Equipamentos homologados e laudos validados; DEOP, DMSL e GAT disponíveis para proteção e comissionamento.
11. Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO e de desligamentos programados aprovados.

Restrições

1. Iniciar a obra somente após assinatura do contrato com a empreiteira executora.
2. Energização no mês da ASPO; B1, B2, B4, B5 e B12 reprogramados para jun/27.
3. Instalar somente com local e desligamento validados.
4. Encerramento técnico antes do inventário; contábil após fiscalização da Gestão de Ativos, até 17/11/2027.

Penalidades

1. Multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
2. Substituição da empreiteira e remanejamento de equipes por baixa capacidade ou atraso.
3. Medição pelas O.S. se a empreiteira não enviar as medições no prazo.
4. Não atingimento do benefício esperado pela unidade.

Datas de Interface – AT e MT

Nível	Marco / atividade de interface	Data prevista	Responsável	Status
MT	Desligamento – 1ºs blocos	06/04/2027	COI / DCMD	A iniciar
MT	Ajuste de proteção – 1º bloco	31/05/2027	DEOP	A iniciar
MT	Comissionamento / GAT – 1º bloco	31/05/2027	DMSL / GAT	A iniciar
MT	Energização – último bloco (B3)	20/08/2027	DCMD	A iniciar

Curva Orçamentária (R$ mil)

Reg.	SIGCOs	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Norte	3 SIGCOs	-	-	-	519	394	182	218	-	-	-	-	-	**1.313**
Centro	7 SIGCOs	-	-	-	1.516	1.736	92	-	-	-	-	-	-	**3.344**
Sul	2 SIGCOs	-	-	-	136	103	203	128	-	-	-	-	-	**571**

Aquisições e Contratações

Item / serviço	Tipo	Data necessária	Status
Religadores (12) e TripSaver (3)	Equipamento	06/04/2027	PMA a emitir
Reguladores de tensão (9)	Equipamento	06/04/2027	PMA a emitir
Empreiteira executora (EPS) – O.S. lote 1	Contratação	30/03/2027	A emitir

Principais Riscos do Projeto

1. Atraso no fornecimento de RL/RT e IEDs (lead time de até 210 dias – SEL).
2. Energização fora do mês ASPO: B1, B2, B4, B5 e B12 (→ jun/27).
3. Concentração: 11 blocos iniciam 06–16/04 e operam 15–30/06.
4. Indisponibilidade de Linha Viva / cancelamento de desligamentos programados.
5. Local sem validação prévia ou empreiteira sem capacidade executiva.
6. Acidente de trabalho com paralisação da obra.


Aquisições e Contratações

Material / serviço	Qtd	SIGCO	Necessário até	Status	Nº PMA / RFP
Religador (RL) 34,5 kV	9	91979, 92094, 92095, 90811	06/04/2027	A confirmar	–
Religador (RL) 13,8 kV	3	92118, 92101, 92102	06/04/2027	A confirmar	–
Regulador de tensão (RT) 34,5 kV	8	89267, 70838, 70978, 90811, 89249	06/04/2027	A confirmar	–
Regulador de tensão (RT) 13,8 kV	1	89307	04/06/2027	A confirmar	–
TripSaver	3	91979	06/04/2027	A confirmar	–
Remanejamento de religador (RL)	1	89307	04/06/2027	Sem aquisição	–
Empreiteira executora da obra (contrato vigente)	–	Todos	06/04/2027	Contrato vigente	–

"Necessário até" = início da execução do bloco mais cedo que usa o item (WBS). Status e nº de PMA/RFP a confirmar com Suprimentos – informações não constam nas planilhas recebidas.

Curva orçamentária 2027

SIGCO	Projeto	Reg.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
92118	Estudo de QS - 4 de Araguaína IV	Norte	-	-	-	62.918	47.818	-	-	-	-	-	-	-	**110.736**
89267	Instalação de RT - LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2 - QP	Norte	-	-	-	455.865	346.457	-	-	-	-	-	-	-	**802.322**
89249	Instalação de RT - LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 - QP	Norte	-	-	-	-	-	181.643	217.971	-	-	-	-	-	**399.614**
90811	Instalação de RL e RT - LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 - QP	Centro	-	-	-	763.392	946.606	91.607	-	-	-	-	-	-	**1.801.605**
92095	Estudo de QS - LD Palmas - Lajeado	Centro	-	-	-	74.006	56.244	-	-	-	-	-	-	-	**130.250**
92101	Estudo de QS - 8 de Palmas IV	Centro	-	-	-	62.918	47.818	-	-	-	-	-	-	-	**110.736**
70838	Instalação de RT - LD Cristalândia - Lagoa da Confusão	Centro	-	-	-	227.054	172.561	-	-	-	-	-	-	-	**399.614**
92102	Estudo de QS - 6 de Palmas IV	Centro	-	-	-	55.368	55.368	-	-	-	-	-	-	-	**110.736**
70978	Instalação de RT e Balanceamento de Fase - LD Paraíso I - Caseara - 2PR0 - QP	Centro	-	-	-	199.957	199.957	-	-	-	-	-	-	-	**399.914**
92094	Estudo de QS - LD Palmas - Aparecida do Rio Negro	Centro	-	-	-	133.210	257.540	-	-	-	-	-	-	-	**390.750**
91979	Estudo de QS - LD Gurupi - Dueré	Sul	-	-	-	136.126	103.456	-	-	-	-	-	-	-	**239.582**
89307	Instalação de RT - 1 de Figueirópolis - 2FGR - QP	Sul	-	-	-	-	-	203.107	127.882	-	-	-	-	-	**330.989**
	Total (R$)		**-**	**-**	**-**	**2.170.814**	**2.233.825**	**476.357**	**345.854**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.226.849**

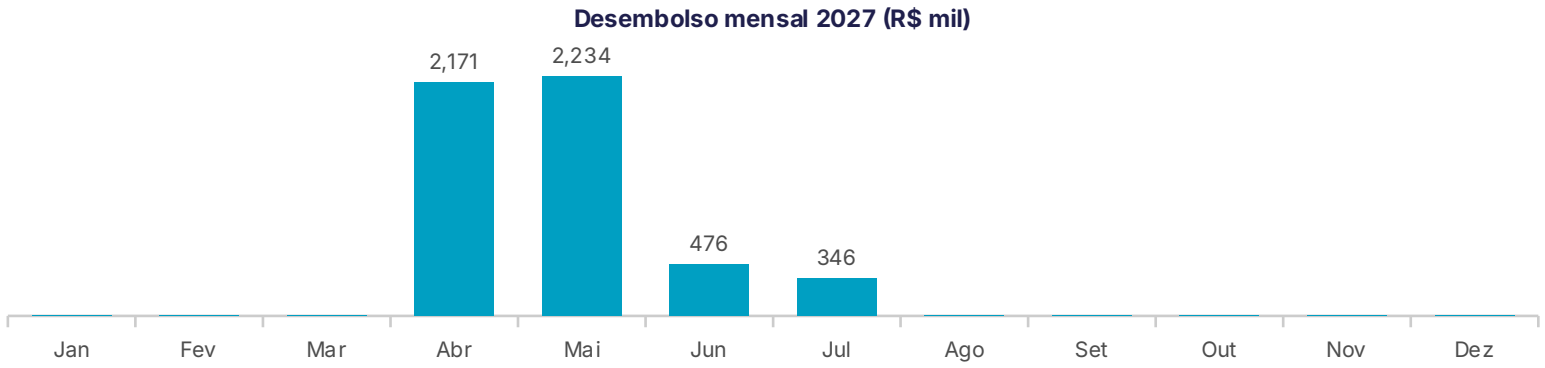

ORÇAMENTO 2027 · BASE 08/10

R$ 5,23 mi

42% do desembolso até abril/27, 84% até maio/27 e 100% até julho/27. Sem desembolso de jan a mar/27: execuções iniciam após 05/04/2027.
Distribuição em dias corridos entre o início da execução e o fim da fiscalização de cada bloco.

Premissas, Restrições e Penalidades

PREMISSAS

1. O projeto será executado conforme orçamento aprovado (base CAPEX 08/10/2026); desvios de rateio de materiais e impostos (referência: até 10%) são absorvidos no orçamento do departamento.
2. EPS com capacidade executiva comprovada para o horizonte de 90 dias; mobilizará somente após geração e assinatura da O.S.
3. Cumprimento dos prazos dos blocos de instalação de equipamentos especiais (RL/RT) definidos na WBS.
4. Contratação de empresas com capacidade técnica e financeira, considerando as obras reguladas concorrentes na mesma empreiteira.
5. Aprovação das LSS e análise da documentação de terceiros pelo SESMT ETO (10 dias corridos) dentro do prazo solicitado.
6. Manutenção do escopo do projeto, sem inclusão de serviços não previstos inicialmente.
7. Ausência de acidentes de trabalho que ocasionem paralisação; EPS atende a todos os procedimentos de segurança e às ITs.
8. PMA dos equipamentos emitido logo após a aprovação do PN, com almoxarifado de destino conferido e kit completo de materiais periféricos.
9. Local de instalação, autorização de passagem, medição de aterramento e sinal GPRS validados (ASPO, COPC e Operação) antes da execução.
10. Equipamentos homologados na base de ativos e laudos validados antes do cadastro; DEOP, DMSL e GAT disponíveis para proteção e comissionamento.
11. Disponibilidade de equipe de Linha Viva ETO e de desligamentos programados aprovados, garantindo continuidade nas áreas energizadas.

RESTRIÇÕES

1. Iniciar a obra somente após assinatura do contrato de prestação de serviços com a empreiteira executora.
2. Energização no mês da ASPO (abr, mai, jun e ago/2027); B1, B2, B4, B5 e B12 reprogramados para jun/27.
3. Instalar equipamentos somente com o local e o desligamento programado validados.
4. Encerramento técnico antes do inventário anual do almoxarifado; contábil após fiscalização da Gestão de Ativos e até 17/11/2027.


PENALIDADES

1. Aplicação de multa às prestadoras de serviço e fornecedores, após notificação, em caso de descumprimento do contrato.
2. Substituição da empreiteira e remanejamento de equipes por baixa capacidade ou atraso; medição pelas O.S. se faltar medição no prazo.
3. Não atingimento do benefício esperado pela unidade.

Principais Riscos do Projeto

	RISCO	PLANO ATENUANTE	PLANO DE CONTINGÊNCIA
1	**Acidente de trabalho** Acidente de trabalho durante a execução da obra	• Reunião de integração com a empreiteira • Inspeções periódicas e DDS • Paradas de segurança trimestrais	• Paralisar qualquer atividade executada de forma insegura • Acionar o SESMT • Investigar o ocorrido
2	**Atraso em projeto, LSS e documentos** Projeto executivo, local sem autorização ou aterramento inadequado e LSS/documentos do SESMT	• Validar o local com ASPO, COPC e Operação antes da execução • Mapear autorizações de passagem; medir o aterramento • Antecipar os documentos (SESMT: 10 dias)	• Remanejar o equipamento / definir novo ponto • Ampliar a malha de aterramento (poço/concreto) • Antecipar outras atividades da obra
3	**Atraso de materiais e equipamentos** RL/RT/TripSaver e kit de periféricos disponíveis só após 05/04/2027 (lead time de até 210 dias)	• PMA logo após o PN; conferir o almoxarifado de destino • Diligenciar fornecedores e compras; kit completo • Acompanhar o forecast (rateio e impostos)	• Adiantar estruturas enquanto o equipamento não chega • Priorizar frentes pela meta de energização • Avaliar fornecedor homologado alternativo
4	**Linha Viva e desligamentos** Falta de equipe de Linha Viva ETO e cancelamento de desligamentos programados	• Estudo prévio de viabilidade de desligamento e transferência de carga • Programar Linha Viva e COI com antecedência	• Intensificar o apoio de Linha Viva; reprogramar desligamentos • Ajustar a sequência das frentes
5	**Atraso no comissionamento** Laudos inconsistentes, equipamento não homologado, falha no EO/TS e comissionamentos concentrados em jun/27	• Fluxo completo antes da SS ao DMSL (aterramento, EO/SIGOT, proteção, SCADA) • Validar laudos e homologação; reunião semanal	• Comissionar em bancada / linha de produção • Chamado à TI/GTD para cadastro; reavaliar a programação
6	**Atraso na execução / abandono de contrato** Baixa capacidade, desmobilização ou fim de contrato da empreiteira, com obras reguladas concorrentes	• Acompanhar capacidade executiva (90 dias) e cronograma semanal • Evitar frentes em contratos próximos do fim; abertura de RFP	• Multa/advertência; remanejar equipes entre regionais • Aditivo de contratos vigentes ou substituição da empresa

Cronograma Macro

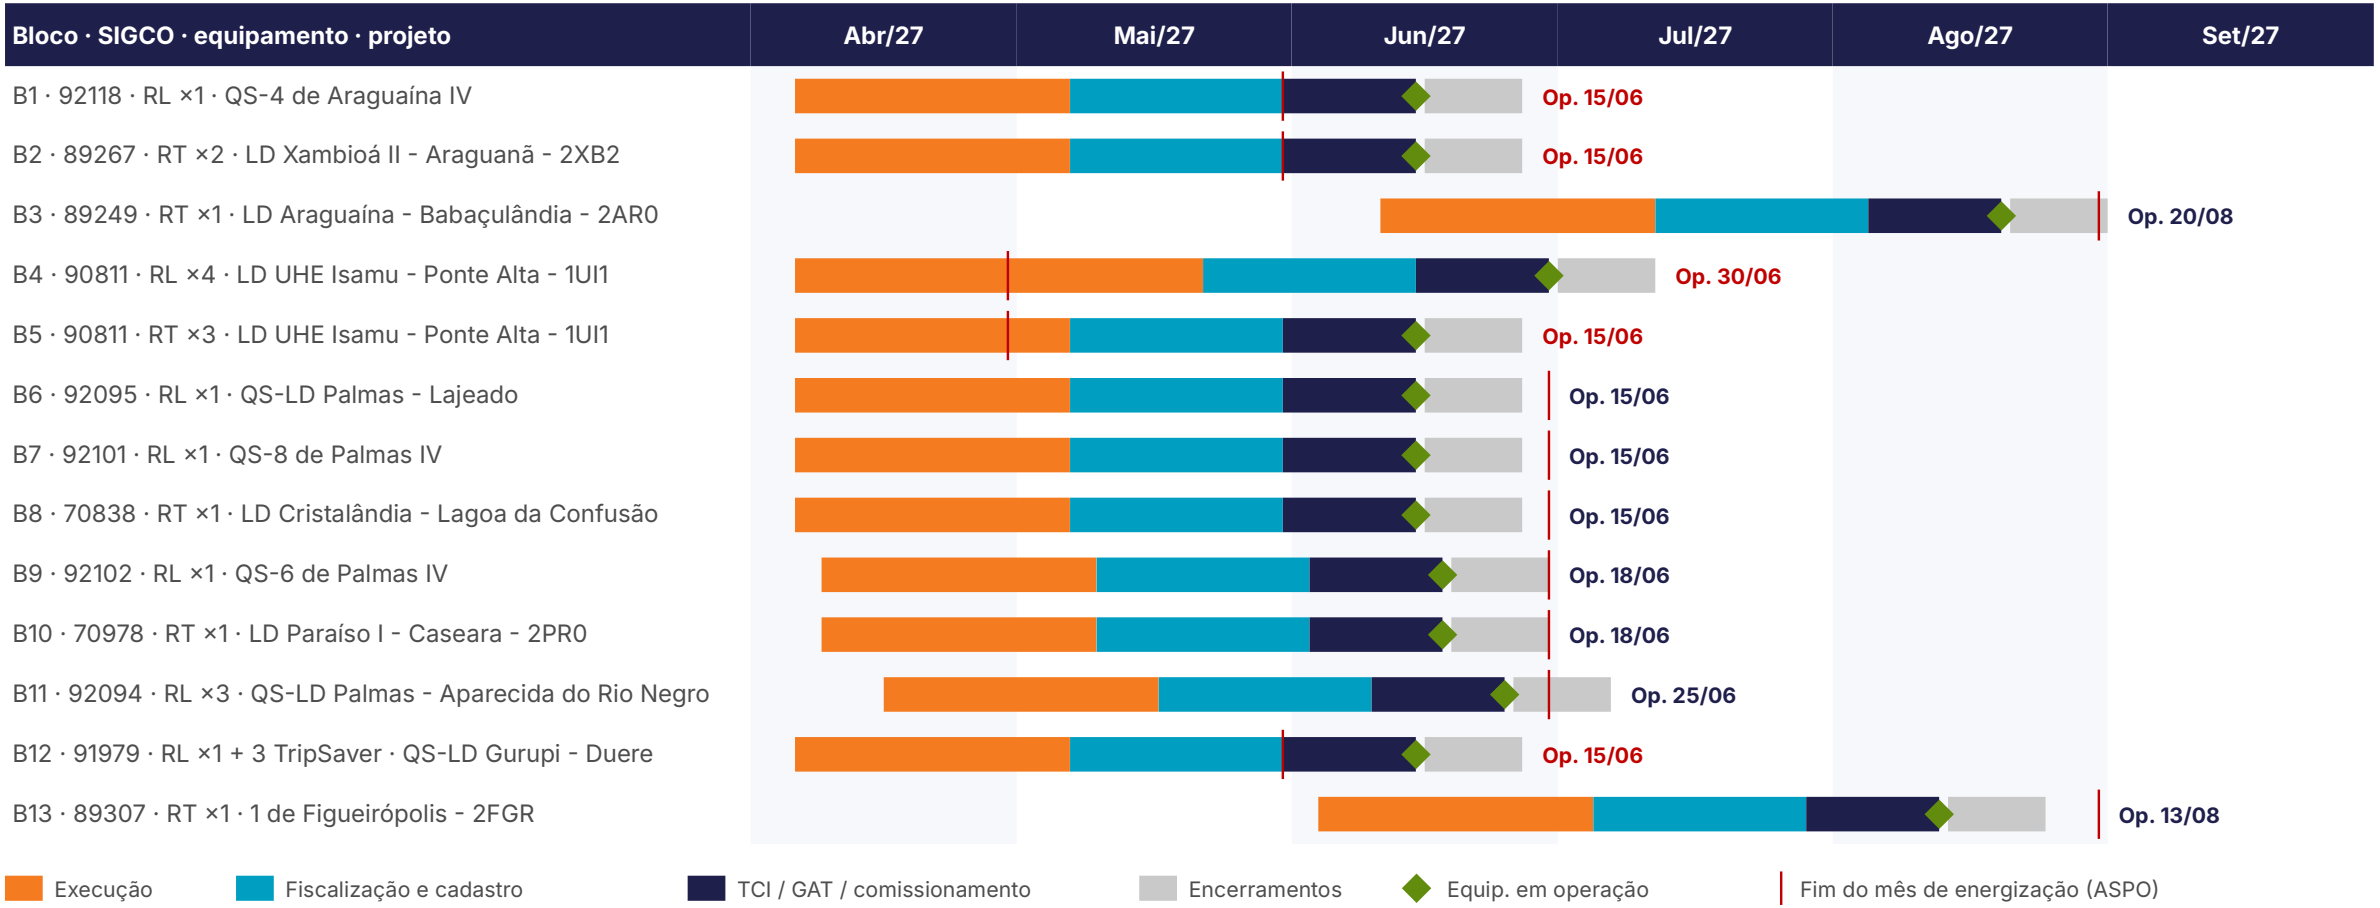

Equipamentos disponíveis somente após 05/04/2027: nenhuma execução inicia antes de 06/04/2027. Operação = início + 70 dias (execução de 30 d) ou + 85 dias (45 d). Em vermelho: operação após o mês de energização definido pela ASPO (B1, B2, B4, B5 e B12); encerramento contábil até 01/09/2027 (limite 17/11/2027).

WBS – Estrutura Analítica do Projeto

PN 2027
Aquisição e Instalação de RL, RT e TripSaver


Escopo do prazo: somente blocos de instalação de equipamentos especiais. Obras de rede (RD MT), projeto executivo e recebimento de material ficam fora desta WBS.

EDT	Bloco	SIGCO	Equipamento
3.1	BLOCO 1 – QS-4 de Araguaína IV	92118	1 RL 13,8 kV
3.2	BLOCO 2 – LD Xambioá II - Araguanã - 2XB2	89267	2 RT 34,5 kV
3.3	BLOCO 3 – LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0	89249	1 RT 34,5 kV
4.1 / 4.2	BLOCO 4 – LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1	90811	4 RL 34,5 kV
4.3	BLOCO 5 – LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1	90811	3 RT 34,5 kV
4.4	BLOCO 6 – QS-LD Palmas - Lajeado	92095	1 RL 34,5 kV
4.5	BLOCO 7 – QS-8 de Palmas IV	92101	1 RL 13,8 kV
4.6	BLOCO 8 – LD Cristalândia - Lagoa da Confusão	70838	1 RT 34,5 kV
4.7	BLOCO 9 – QS-6 de Palmas IV	92102	1 RL 13,8 kV
4.8	BLOCO 10 – LD Paraíso I - Caseara - 2PR0	70978	1 RT 34,5 kV
4.9	BLOCO 11 – QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro	92094	3 RL 34,5 kV
5.1 / 5.2	BLOCO 12 – QS-LD Gurupi - Duere	91979	1 RL rural 34,5 kV + 3 TripSaver
5.3	BLOCO 13 – 1 de Figueirópolis - 2FGR	89307	1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL

Pacotes de trabalho de cada bloco
EDT.1 Executar obras (30 / 45 d)
EDT.2 Obras concluídas ◆
EDT.3 Fiscalização (12 d)
EDT.4 Cadastro EO / Integração parcial (10 d)
EDT.5 Entrega do TCI / Integração final (15 d)
EDT.6 Chamado / Atend. GAT (8 d)
EDT.7 Comissionar equipamentos (15 d)
EDT.8 Equipamentos em operação ◆
EDT.9 Encerramento técnico (7 du)
EDT.10 Encerramento contábil (3 du)

WBS – Cronograma Detalhado (1/3)

Tarefa	Dur. · Início – Término
BLOCOS 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 12 · SIGCO 92118, 89267, 90811 (RT), 92095, 92101, 70838 e 91979 — execução de 30 dias	
Executar Obras	30 d · 06/04 – 06/05
Fiscalização	12 d · 07/05 – 19/05
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 20/05 – 30/05
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 31/05 – 15/06
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 31/05 – 08/06
Comissionar Equipamentos	15 d · 31/05 – 15/06
Encerramento Técnico	7 du · 16/06 – 23/06
Encerramento Contábil	3 du · 24/06 – 27/06
BLOCO 4 · SIGCO 90811 · LD UHE Isamu - Ponte Alta - 1UI1 — 4 RL 34,5 kV	
Executar Obras	45 d · 06/04 – 21/05
Fiscalização	12 d · 22/05 – 03/06
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 04/06 – 14/06
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 15/06 – 30/06
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 15/06 – 23/06
Comissionar Equipamentos	15 d · 15/06 – 30/06
Encerramento Técnico	7 du · 01/07 – 08/07
Encerramento Contábil	3 du · 09/07 – 12/07

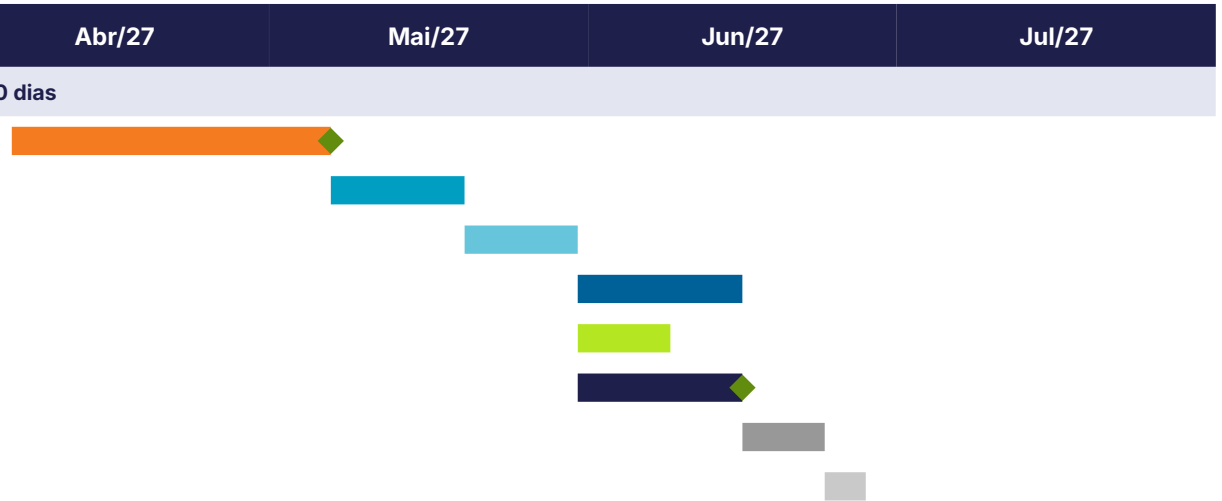

Execução · Fiscalização · Cadastro EO · TCI / Integração final · GAT · Comissionamento · Enc. técnico · Enc. contábil · Marcos: obra concluída / em operação

WBS – Cronograma Detalhado (2/3)

Tarefa	Dur. · Início – Término
BLOCOS 9 e 10 · SIGCO 92102, 70978 — B9: 1 RL 13,8 kV | B10: 1 RT 34,5 kV	
Executar Obras	30 d · 09/04 – 09/05
Fiscalização	12 d · 10/05 – 22/05
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 23/05 – 02/06
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 03/06 – 18/06
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 03/06 – 11/06
Comissionar Equipamentos	15 d · 03/06 – 18/06
Encerramento Técnico	7 du · 19/06 – 26/06
Encerramento Contábil	3 du · 27/06 – 30/06
BLOCO 11 · SIGCO 92094 · QS-LD Palmas - Aparecida do Rio Negro — 3 RL 34,5 kV	
Executar Obras	30 d · 16/04 – 16/05
Fiscalização	12 d · 17/05 – 29/05
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 30/05 – 09/06
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 10/06 – 25/06
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 10/06 – 18/06
Comissionar Equipamentos	15 d · 10/06 – 25/06
Encerramento Técnico	7 du · 26/06 – 03/07
Encerramento Contábil	3 du · 04/07 – 07/07



Execução · Fiscalização · Cadastro EO · TCI / Integração final · GAT · Comissionamento · Enc. técnico · Enc. contábil · Marcos: obra concluída / em operação

WBS – Cronograma Detalhado (3/3)

Tarefa	Dur. · Início – Término
BLOCO 13 · SIGCO 89307 · 1 de Figueirópolis - 2FGR — 1 RT 13,8 kV + remanejamento de 1 RL	
Executar Obras	30 d · 04/06 – 04/07
Fiscalização	12 d · 05/07 – 17/07
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 18/07 – 28/07
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 29/07 – 13/08
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 29/07 – 06/08
Comissionar Equipamentos	15 d · 29/07 – 13/08
Encerramento Técnico	7 du · 14/08 – 21/08
Encerramento Contábil	3 du · 22/08 – 25/08
BLOCO 3 · SIGCO 89249 · LD Araguaína - Babaçulândia - 2AR0 — 1 RT 34,5 kV	
Executar Obras	30 d · 11/06 – 11/07
Fiscalização	12 d · 12/07 – 24/07
Cadastro EO / Integração parcial	10 d · 25/07 – 04/08
Entrega do TCI / Integração final	15 d · 05/08 – 20/08
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8 d · 05/08 – 13/08
Comissionar Equipamentos	15 d · 05/08 – 20/08
Encerramento Técnico	7 du · 21/08 – 28/08
Encerramento Contábil	3 du · 29/08 – 01/09



Execução · Fiscalização · Cadastro EO · TCI / Integração final · GAT · Comissionamento · Enc. técnico · Enc. contábil · Marcos: obra concluída / em operação

WBS · Gestão, Planejamento e Norte

Nome da tarefa	Dur.	Início	Término
1 · GERENCIAMENTO DO PROJETO (PMBOK)	**337**	**06/10/2026**	**08/09/2027**
1.1 Transfer Meeting (TM)	0	06/10/2026	06/10/2026
1.2 Kickoff Meeting (KOM)	0	29/10/2026	29/10/2026
1.3 Project Review Meeting (PRM) / linha de base	0	02/12/2026	02/12/2026
1.4 Follow-up Meetings (FUM) mensais	mensal	15/01/2027	16/08/2027
1.5 Close Meeting (CM)	0	08/09/2027	08/09/2027
2 · PLANEJAMENTO E SUPRIMENTOS	**212**	**03/11/2026**	**03/06/2027**
2.1 Criar PMA de materiais específicos (RL, RT, TripSaver)	30	03/11/2026	03/12/2026
2.2 Realizar estudo Site Survey	30	09/11/2026	09/12/2026
2.3 Elaborar projetos executivos	60	03/11/2026	02/01/2027
2.4 Analisar projetos executivos (COPC)	15	04/01/2027	19/01/2027
2.5 Check de consistência orçamento x projeto executivo	10	20/01/2027	30/01/2027
2.6 Report da análise para ASPO/DCMD	5	01/02/2027	06/02/2027
2.7 Receber equipamentos - Lote 1 (B1, B2 e B4 a B12)	0	05/04/2027	05/04/2027
2.8 Receber equipamentos - Lote 2 (B3 e B13)	0	28/05/2027	28/05/2027
2.9 Emitir O.S. e mobilizar EPS - Lote 1	5	31/03/2027	05/04/2027
2.10 Emitir O.S. e mobilizar EPS - Lote 2	5	29/05/2027	03/06/2027

Nome da tarefa	Dur.	Início	Término
3 · REGIONAL NORTE	**148**	**06/04/2027**	**01/09/2027**
BLOCO 1 · 92118 · 4 de Araguaína IV – 1 RL 13,8 kV	**82**	**06/04/2027**	**27/06/2027**
Executar Obras	30	06/04/2027	06/05/2027
Obras Concluídas	0	06/05/2027	06/05/2027
Fiscalização	12	07/05/2027	19/05/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	20/05/2027	30/05/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	31/05/2027	15/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	31/05/2027	08/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	31/05/2027	15/06/2027
Equipamentos em Operação	0	15/06/2027	15/06/2027
Encerramento Técnico	7	16/06/2027	23/06/2027
Encerramento Contábil	3	24/06/2027	27/06/2027
BLOCO 2 · 89267 · LD Xambioá II–Araguanã – 2 RT 34,5 kV	**82**	**06/04/2027**	**27/06/2027**
Executar Obras	30	06/04/2027	06/05/2027
Obras Concluídas	0	06/05/2027	06/05/2027
Fiscalização	12	07/05/2027	19/05/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	20/05/2027	30/05/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	31/05/2027	15/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	31/05/2027	08/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	31/05/2027	15/06/2027
Equipamentos em Operação	0	15/06/2027	15/06/2027
Encerramento Técnico	7	16/06/2027	23/06/2027
Encerramento Contábil	3	24/06/2027	27/06/2027

WBS · Regionais Norte e Sul

Nome da tarefa	Dur.	Início	Término
BLOCO 3 · 89249 · LD Araguaína–Babaçulândia – 1 RT 34,5 kV	**82**	**11/06/2027**	**01/09/2027**
Executar Obras	30	11/06/2027	11/07/2027
Obras Concluídas	0	11/07/2027	11/07/2027
Fiscalização	12	12/07/2027	24/07/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	25/07/2027	04/08/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	05/08/2027	20/08/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	05/08/2027	13/08/2027
Comissionar Equipamentos	15	05/08/2027	20/08/2027
Equipamentos em Operação	0	20/08/2027	20/08/2027
Encerramento Técnico	7	21/08/2027	28/08/2027
Encerramento Contábil	3	29/08/2027	01/09/2027
5 · REGIONAL SUL	**141**	**06/04/2027**	**25/08/2027**
BLOCO 12 · 91979 · LD Gurupi–Dueré – 1 RL 34,5 kV + 3 TripSaver	**82**	**06/04/2027**	**27/06/2027**
Executar Obras	30	06/04/2027	06/05/2027
Obras Concluídas	0	06/05/2027	06/05/2027
Fiscalização	12	07/05/2027	19/05/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	20/05/2027	30/05/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	31/05/2027	15/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	31/05/2027	08/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	31/05/2027	15/06/2027
Equipamentos em Operação	0	15/06/2027	15/06/2027
Encerramento Técnico	7	16/06/2027	23/06/2027
Encerramento Contábil	3	24/06/2027	27/06/2027

Nome da tarefa	Dur.	Início	Término
BLOCO 13 · 89307 · 1 de Figueirópolis – 1 RT 13,8 kV + rem. RL	**82**	**04/06/2027**	**25/08/2027**
Executar Obras	30	04/06/2027	04/07/2027
Obras Concluídas	0	04/07/2027	04/07/2027
Fiscalização	12	05/07/2027	17/07/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	18/07/2027	28/07/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	29/07/2027	13/08/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	29/07/2027	06/08/2027
Comissionar Equipamentos	15	29/07/2027	13/08/2027
Equipamentos em Operação	0	13/08/2027	13/08/2027
Encerramento Técnico	7	14/08/2027	21/08/2027
Encerramento Contábil	3	22/08/2027	25/08/2027

WBS · Regional Centro (1/2)

Nome da tarefa	Dur.	Início	Término
4 · REGIONAL CENTRO	**97**	**06/04/2027**	**12/07/2027**
BLOCO 5 · 90811 · LD UHE Isamu–Ponte Alta – 3 RT 34,5 kV (P. II)	**82**	**06/04/2027**	**27/06/2027**
Executar Obras	30	06/04/2027	06/05/2027
Obras Concluídas	0	06/05/2027	06/05/2027
Fiscalização	12	07/05/2027	19/05/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	20/05/2027	30/05/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	31/05/2027	15/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	31/05/2027	08/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	31/05/2027	15/06/2027
Equipamentos em Operação	0	15/06/2027	15/06/2027
Encerramento Técnico	7	16/06/2027	23/06/2027
Encerramento Contábil	3	24/06/2027	27/06/2027
BLOCO 4 · 90811 · LD UHE Isamu–Ponte Alta – 4 RL 34,5 kV + rede (P. I)	**97**	**06/04/2027**	**12/07/2027**
Executar Obras	45	06/04/2027	21/05/2027
Obras Concluídas	0	21/05/2027	21/05/2027
Fiscalização	12	22/05/2027	03/06/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	04/06/2027	14/06/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	15/06/2027	30/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	15/06/2027	23/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	15/06/2027	30/06/2027
Equipamentos em Operação	0	30/06/2027	30/06/2027
Encerramento Técnico	7	01/07/2027	08/07/2027
Encerramento Contábil	3	09/07/2027	12/07/2027

Nome da tarefa	Dur.	Início	Término
BLOCO 6 · 92095 · LD Palmas–Lajeado – 1 RL 34,5 kV	**82**	**06/04/2027**	**27/06/2027**
Executar Obras	30	06/04/2027	06/05/2027
Obras Concluídas	0	06/05/2027	06/05/2027
Fiscalização	12	07/05/2027	19/05/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	20/05/2027	30/05/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	31/05/2027	15/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	31/05/2027	08/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	31/05/2027	15/06/2027
Equipamentos em Operação	0	15/06/2027	15/06/2027
Encerramento Técnico	7	16/06/2027	23/06/2027
Encerramento Contábil	3	24/06/2027	27/06/2027
BLOCO 7 · 92101 · 8 de Palmas IV – 1 RL 13,8 kV	**82**	**06/04/2027**	**27/06/2027**
Executar Obras	30	06/04/2027	06/05/2027
Obras Concluídas	0	06/05/2027	06/05/2027
Fiscalização	12	07/05/2027	19/05/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	20/05/2027	30/05/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	31/05/2027	15/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	31/05/2027	08/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	31/05/2027	15/06/2027
Equipamentos em Operação	0	15/06/2027	15/06/2027
Encerramento Técnico	7	16/06/2027	23/06/2027
Encerramento Contábil	3	24/06/2027	27/06/2027

WBS · Regional Centro (2/2)

Nome da tarefa	Dur.	Início	Término
BLOCO 8 · 70838 · LD Cristalândia–L. da Confusão – 1 RT 34,5 kV	**82**	**06/04/2027**	**27/06/2027**
Executar Obras	30	06/04/2027	06/05/2027
Obras Concluídas	0	06/05/2027	06/05/2027
Fiscalização	12	07/05/2027	19/05/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	20/05/2027	30/05/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	31/05/2027	15/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	31/05/2027	08/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	31/05/2027	15/06/2027
Equipamentos em Operação	0	15/06/2027	15/06/2027
Encerramento Técnico	7	16/06/2027	23/06/2027
Encerramento Contábil	3	24/06/2027	27/06/2027
BLOCO 9 · 92102 · 6 de Palmas IV – 1 RL 13,8 kV	**82**	**09/04/2027**	**30/06/2027**
Executar Obras	30	09/04/2027	09/05/2027
Obras Concluídas	0	09/05/2027	09/05/2027
Fiscalização	12	10/05/2027	22/05/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	23/05/2027	02/06/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	03/06/2027	18/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	03/06/2027	11/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	03/06/2027	18/06/2027
Equipamentos em Operação	0	18/06/2027	18/06/2027
Encerramento Técnico	7	19/06/2027	26/06/2027
Encerramento Contábil	3	27/06/2027	30/06/2027

Nome da tarefa	Dur.	Início	Término
BLOCO 10 · 70978 · LD Paraíso I–Caseara – 1 RT 34,5 kV + balanc.	**82**	**09/04/2027**	**30/06/2027**
Executar Obras	30	09/04/2027	09/05/2027
Obras Concluídas	0	09/05/2027	09/05/2027
Fiscalização	12	10/05/2027	22/05/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	23/05/2027	02/06/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	03/06/2027	18/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	03/06/2027	11/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	03/06/2027	18/06/2027
Equipamentos em Operação	0	18/06/2027	18/06/2027
Encerramento Técnico	7	19/06/2027	26/06/2027
Encerramento Contábil	3	27/06/2027	30/06/2027
BLOCO 11 · 92094 · LD Palmas–Ap. do Rio Negro – 3 RL 34,5 kV	**82**	**16/04/2027**	**07/07/2027**
Executar Obras	30	16/04/2027	16/05/2027
Obras Concluídas	0	16/05/2027	16/05/2027
Fiscalização	12	17/05/2027	29/05/2027
Cadastro EO / Integração parcial	10	30/05/2027	09/06/2027
Entrega do TCI pela empreiteira / Integração final	15	10/06/2027	25/06/2027
Abertura de chamado / Atendimento GAT	8	10/06/2027	18/06/2027
Comissionar Equipamentos	15	10/06/2027	25/06/2027
Equipamentos em Operação	0	25/06/2027	25/06/2027
Encerramento Técnico	7	26/06/2027	03/07/2027
Encerramento Contábil	3	04/07/2027	07/07/2027

KICKOFF MEETING · PN 2027 · AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RL, RT E TRIPSAVER

Obrigado.

Escritório de Projetos PMO-ETO



GERENTE DO PROJETO
SANDRO PADILHA



UNIDADE
Energisa Tocantins
